



2014年工作总结

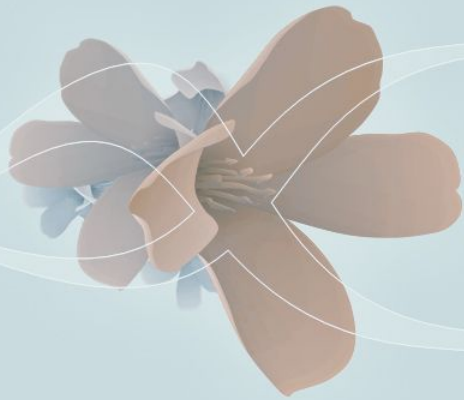


实验室建设管理科

2015年1月

2014年，实验室建设管理科以服务教学科研为宗旨，努力工作，在实验室建设、整合、安全等方面取得了一定的成绩，基本完成了本年度的工作任务和计划。

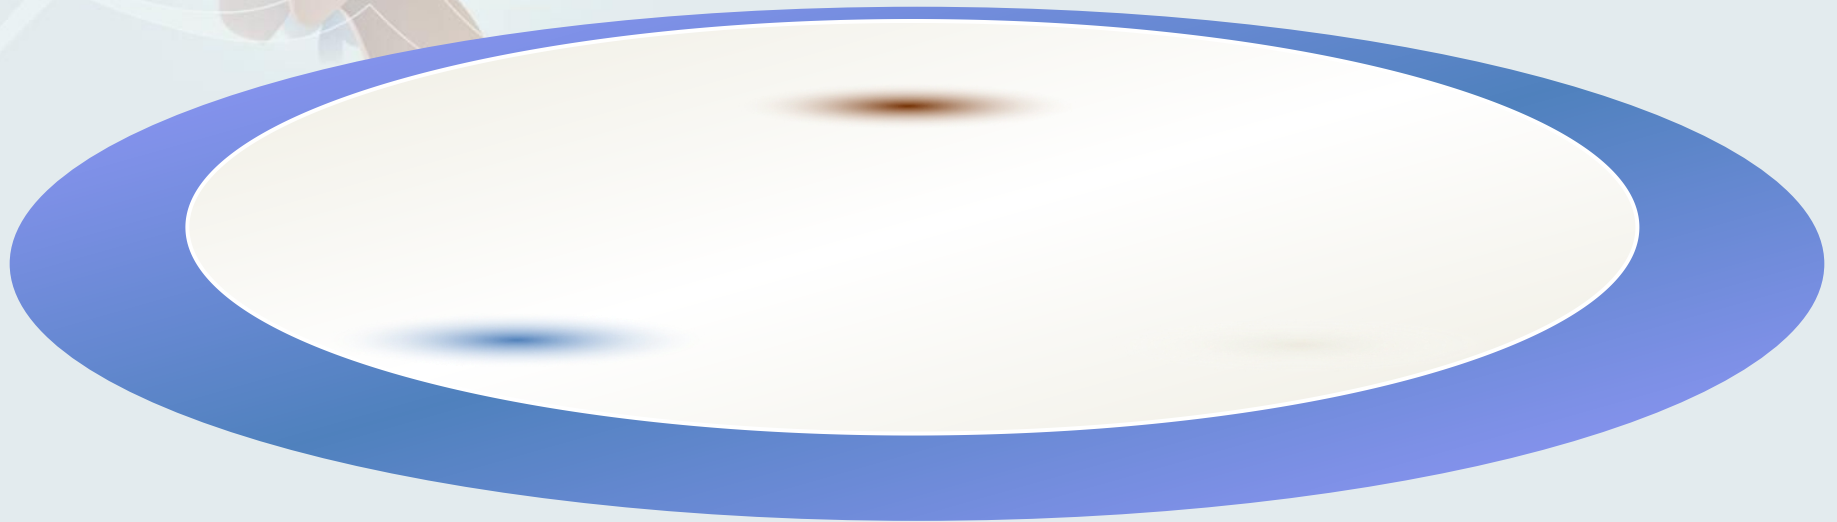

1、深入调研，统筹计划，有序推进实验室建设工作

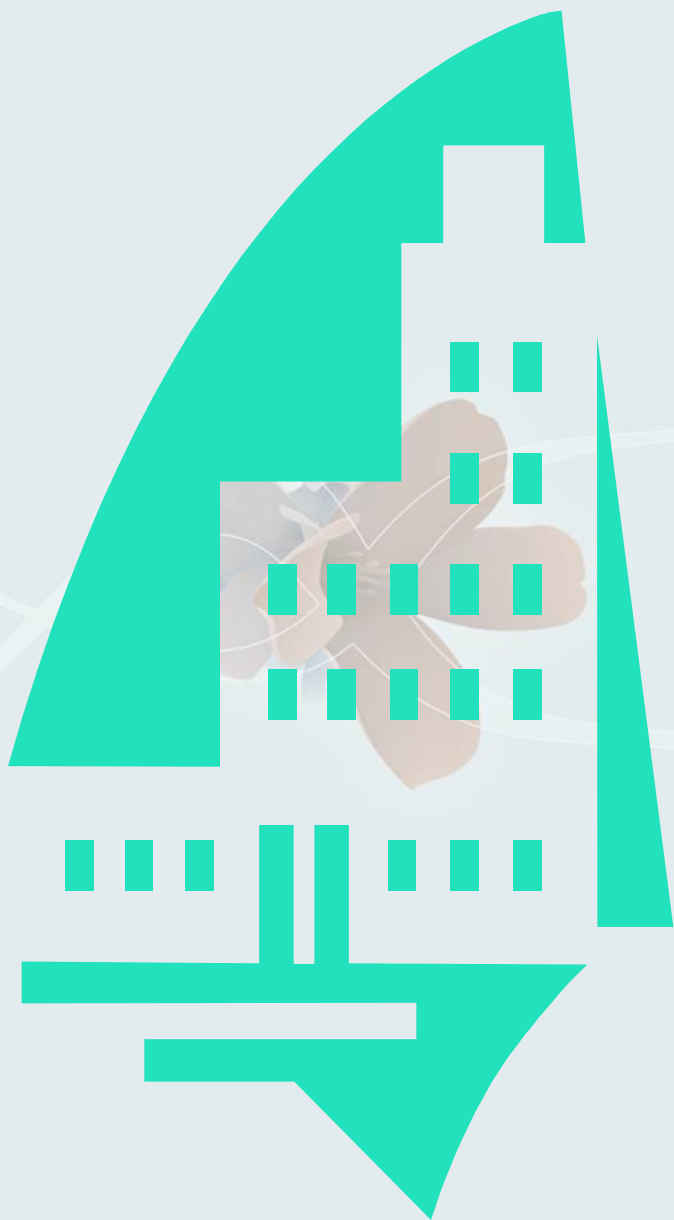

2013年7月启动了2014-2017年实验室建设规划
(项目库)的编制工作

2013年年底督促各教学单位编制了2014年实验室建设计划

2014年年初逐个项目单位走访、调研、沟通

2014年3月组织了项目初审、专家论证等评审工作

最终确立40个建设项目，分别从校内自筹、中央财政计划、振兴
计划中执行

项目执行情况

振兴计划6项总预算396.85万元
已开标1项23.65万元

中央财政12项中标总金额284.855万元
已执行完毕5项98.865万元

校内自筹22项中标总金额495.0261万元
已执行完毕19项387.88万元

2014年实验室建设项目合计40个项目，
总预算1256.08万元，截止至2015年1月20日，已开标35项总金额803.5311万元，
已执行完毕24项486.745万元

新建专业实验
(实训)室12个

现场总线、电子实训、过程控制、电力系统、工场供电、无线传感、教育综合、音乐系双排键、教育系电子琴、全数字语音室、物理仿真等

完善功能实验
(实训)室10个

信息与信号、ARM、单片机、光纤通信、金融工程、电子商务、财务管理、政法综合、艺术与科技专业改造、生命科学基础实验中心等

扩组实验
(实训)室4个

智能手机、工程光学、激光原理、发酵罐等

设备更新实验
(实训)室5个


数学与计算科学机房、美术系401机房、美术系501机房、园林绘图室、现代教育中心多媒体教室等

基础设施项目
2个

电气学院、生命科学系实验台与资料柜等

2. 严格程序、优化管理，加强实验室建设项目建设过程监管

☆2.1严格实验室建设项目申报、立项、招标、执行、验收、报销等程序，优化管理

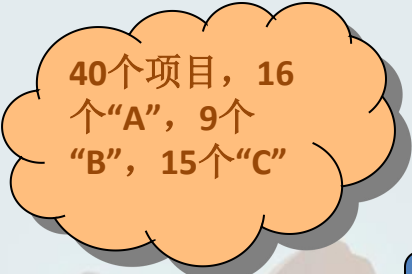

40个项目，16
个“A”，9个
“B”，15个“C”

申报工作要求早启动、多调研、深沟通



立项工作要求谨慎论证



项目招标工作要求需方技术参数制定严谨；供方资质、信誉、合作记录良好等



执行过程勤沟通（供货时间、接货安排、异常处理等）



验收工作要求组织及时、过程合法、结论公正



报销工作要求资料完整、手续齐全、登记详细、处理及时




实验室建设项目过程管理工作良性循环



☆2.2 坚持实验室建设项目检查与验收工作

2014年10月，组织了针对2013年实验室建设项目的检查与验收工作。2013年合计执行了59个实验室建设项目，除空调外执行金额1991.0048万元。

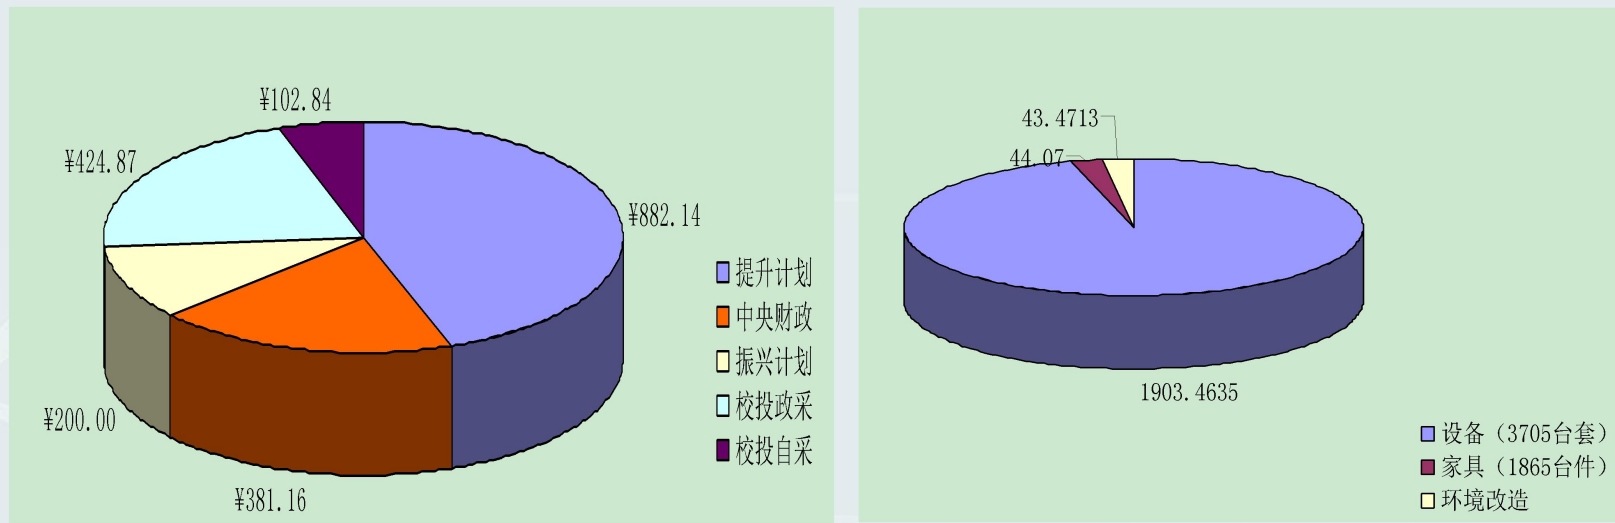

2013年实验室建设项目经费来源及去向图示

2013年投入的资金多，建设的实验室几乎惠及到各个专业，按运行两个学期计算，共影响到的实验课程达到**250**门，新增或改进的教学实验项目达到**970**个**51934**学时，新增或改进的开放实验项目达到**322**个**161150**人时数。

3.加强宣传，促进实验室安全管理工作



2014年1月下达《关于做好实验室防火、防盗等安全防范工作的通知》，并要求各单位实验室安全工作实行三级负责制，每个实验室的安全工作都要落实到人，同时要签订《实验室安全责任书》

积极学习并宣传安徽省教育厅于2014年9月22日印发的《安徽省高等学校实验室安全管理的通知》（皖教秘科〔2014〕32号）

认识到我院在实验室化学安全管理、实验室生物安全管理、实验废弃物安全管理、实验室仪器设备与操作安全管理、实验室设施安全管理等方面尚有待改进。

2015年1月下达《关于做好实验室防火、防盗等安全防范工作的通知》（教务〔2015〕4号），再次强调皖教秘科〔2014〕32号文件，组织全校实验室安全检查，并督促各实验室做好假期安全防范工作。

草拟《淮南师范学院实验室安全管理实施细则》

**安全来自警惕
事故出于麻痹**

安全发展 预防为主



NBH14

4.精确统计，进一步细化实验室管理基础数据的统计工作

☆ 4.1 实验室建设经费及购置设备统计

为精细化管理实验室建设经费，准确掌握各实验室设备配置，实验室建设管理科在对每项实验室建设项目设备进行验收及登记入账时，经费记账精确到每笔支出（包括配套耗材及布线改造）、设备放置地点精准到每个实验室分室，同时明确了每台设备的使用人及验收人，确保了实验室后继管理工作的顺利进行。截止至2015年1月20日，2014年立项建设的项目中，已验收报账登记的有24项，总金额486.745万元（不含零星采购项目），其中单价不低于800元的仪器设备760台（件）金额合计340.9684万元，配套低值设备2896个（件）金额合计15.7263万元，家具852件（套）金额合计24.4453万元，软件13套金额合计102.08万元，还有环境改造费用3.525万元。



☆ 4.2 实验室个数与实验室面积统计

2014年，新增了现场总线、电子实训、过程控制等12个专业实验室，另由于生命科学系在泉山校区新规划了基础生物学实验室及园林绘图室等17个实验室，所以相比2013年，直接用于实验教学的实验室个数增加了29个，增至273个；面积增加了1212.6645 m²，达到了约2.72m²。



5.2015年工作要点

5.1 继续深入理论学习，加强廉政建设，提高管理水平。

5.2 进一步完善实验室安全管理制度。

5.3 提高自身素质及工作艺术水平，结合岗位职责，进一步提高服务工作质量。

5.4 2014年立项但未执行完毕的实验室建设项目的继续跟踪执行。

5.5 切实做好2015年实验室建设项目立项及执行过程管理工作。

5.6 进一步规范实验教学设备管理工作。

敬请批评指正

